

令和7年度(2025年度) 最終処分場の維持管理に関する記録

令和7年7月
クリーンセンターまにわ

施設設置者名	真庭市
施設名	真庭市一般廃棄物最終処分場
埋立対象物	クリーンセンターまにわから排出される焼却残渣及び破碎ガラス
埋立地面積	4,500㎡
埋立地容量	29,432㎡

◎埋立てた廃棄物の種類及び数量

種類	埋立数量
焼却灰	0 t
集塵灰	0 t
破碎ガラス	0 t
合計	0 t

※廃棄物埋立は令和3年度末で終了。
現在は浸出水処理及び施設管理を行っている。


◎放流水、地下水の状況

日付		採取日	令和7年7月10日
		測定結果	令和7年7月28日
放流水	pH：水素イオン濃度	7.3	
	BOD (mg/ℓ)：生物化学的酸素要求量	0.5 未満	
	CODMn(mg/ℓ)：化学的酸素要求量	2.3	
	ss(mg/ℓ)：浮遊物質	1 未満	
	T-N(mg/ℓ)：窒素含有量	2.9	
地下水	電気伝導率 (ms/m) (上流)	24	
	電気伝導率 (ms/m) (地下水No.1)	37	
	電気伝導率 (ms/m) (地下水No.2)	50	
	電気伝導率 (ms/m) (堰堤口)	24	
	塩化物イオン(mg/ℓ) (上流)	3	
	塩化物イオン(mg/ℓ) (地下水No.1)	42	
	塩化物イオン(mg/ℓ) (地下水No.2)	72	
	塩化物イオン(mg/ℓ) (堰堤口)	18	
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等			
備考			
注1)放流水、地下水水質測定1ヶ月/1回 年間12回実施			
注2)放流水及び地下水は年1回の精密水質検査・ダイオキシン類測定を行う。結果については、別紙にて報告する。			
注3) モニタリング採水位置は、別紙「モニタリング採水位置図」のとおり			

◎埋立地、浸出水処理設備の状況

埋立地点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、擁壁等の状況、遮水工状況														
点検は1ヶ月/1回実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○															
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等															

浸出水処理設備点検項目	調整池状況、浸出水処理設備の点検														
点検は平日に実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○				○	○					○	○	○	○	
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等															

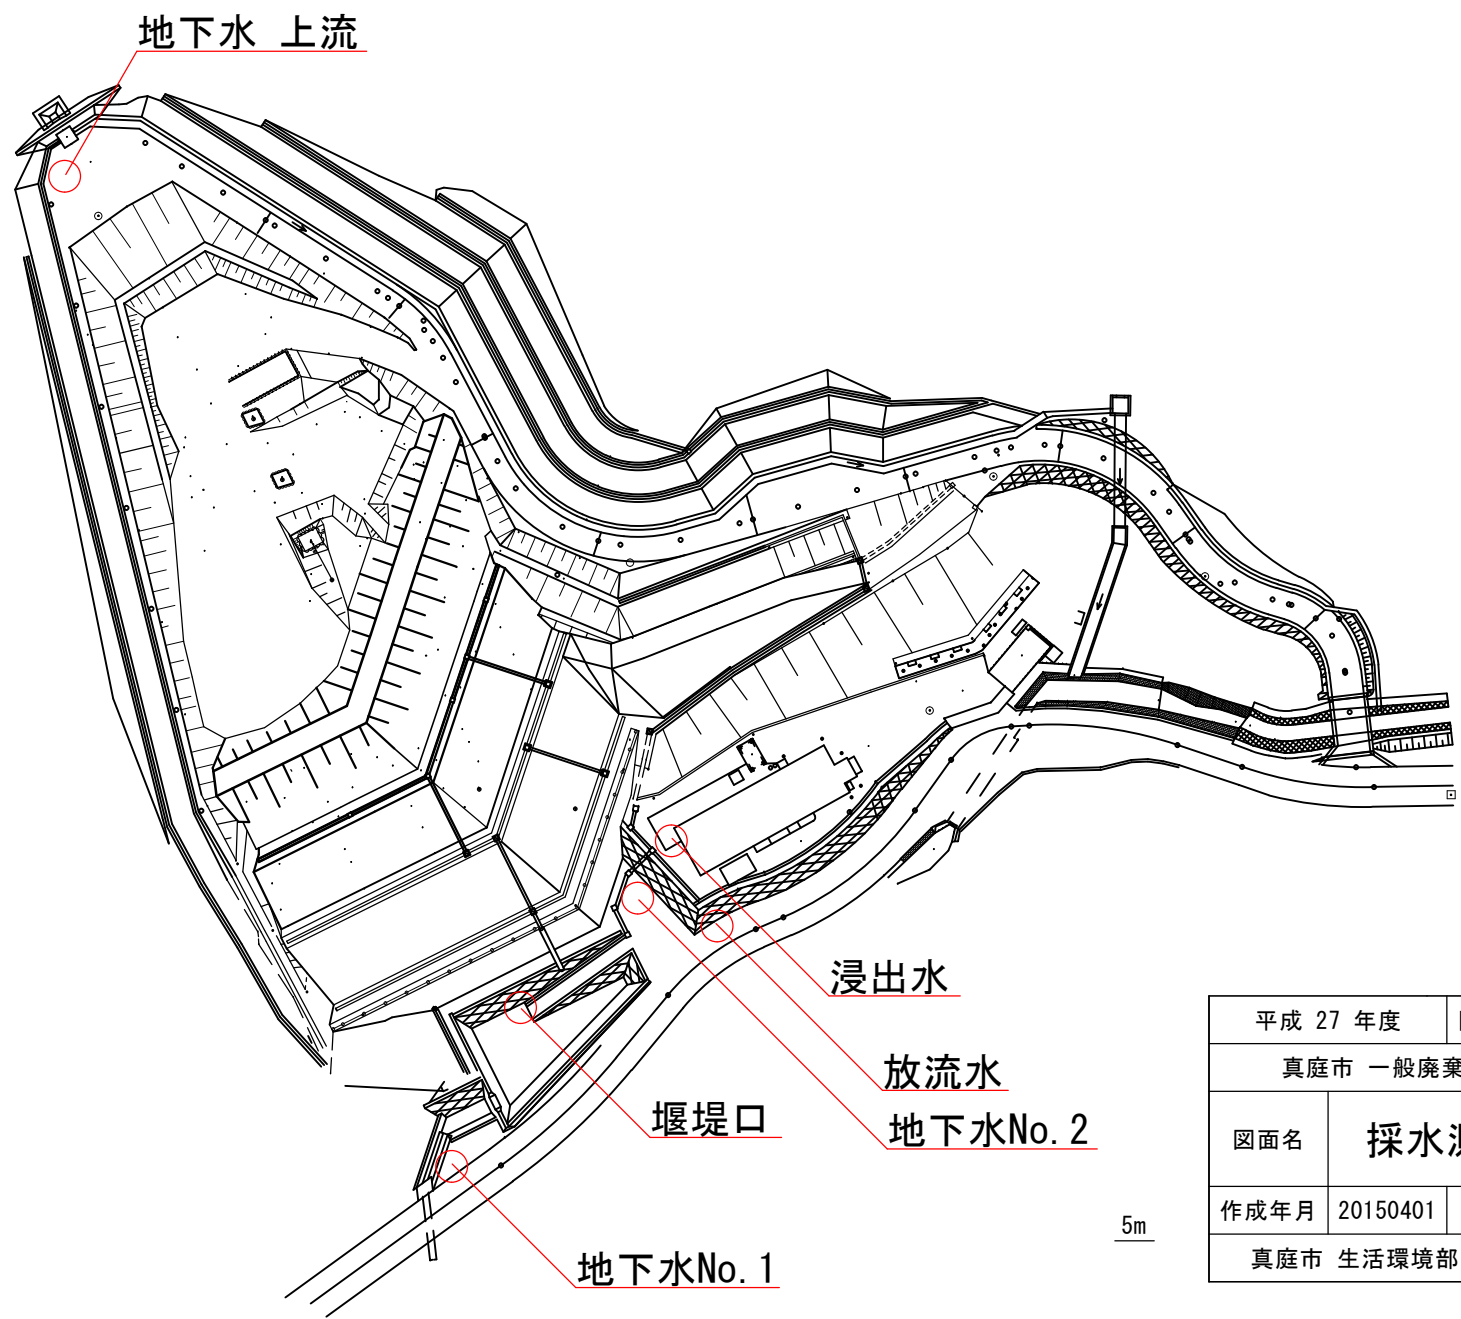

平成 27 年度		図面番号	1
真庭市 一般廃棄物最終処分場			
図面名	採水測定位置図		
作成年月	20150401	縮尺	S=1:1000 (A4)
真庭市 生活環境部 クリーンセンターまにわ			
